

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

2段目平地の擁壁について

2段目平地の擁壁（逆T型擁壁H＝5m）は6月20日（火）に足場の解体が終わり、今後埋戻し、2段目南側のPC-L型擁壁の設置を行います。

また2段目道路南側のPC-L型擁壁も設置されました。



北側法面の形成について


6月26日より北側法面の形成を行っています。

形成は上段より行い、5mごとに小段を作り側溝を設置していきます。

現在は青いシートの部分が形成完了しています。



工事箇所

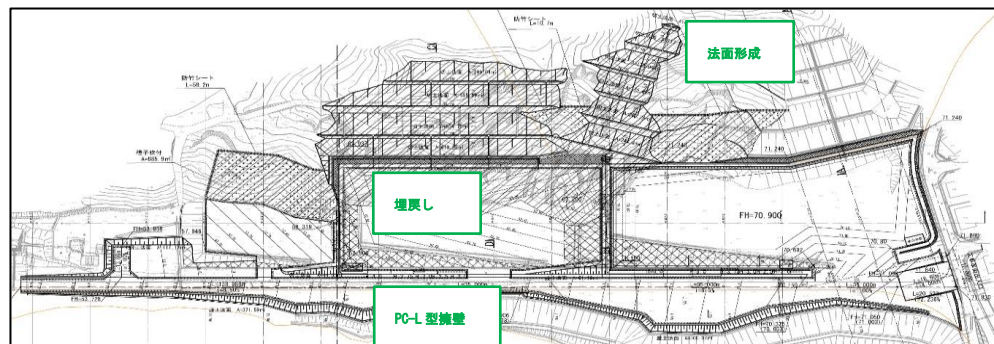

※ 工事期間中、皆様に何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280
