


## 相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

### 【基礎工事について】

6月18日から消防本庁棟の基礎工事を行っています。

基礎工事はA、B、Cの工区に分けて進めており、写真はA工区の掘削を行った後、捨てコンクリートを行った状態です。




### 【配筋について】

7月10日から配筋の施工を行っています。

Bブロックの捨てコンクリートは7月17日に行い、現在はA工区の配筋が概ね終了し、引き続きB工区の配筋を行います。

また、今月末には外部の型枠の設置を行っていく予定です。

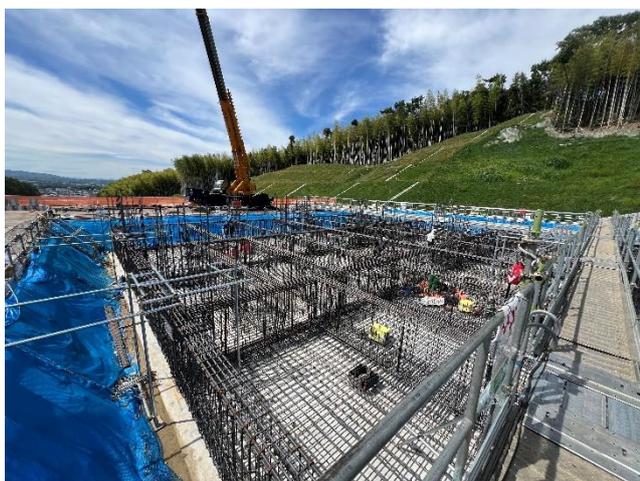

※ 夏季休業（お盆休み）のお知らせ

庁舎建設工事は8月10日から8月18日までお盆休みとさせていただきます。

問い合わせ	相楽中部消防組合消防本部 総務課	0774-75-1380
	大鉄・森本特定建設工事共同企業体	0774-34-3321
