大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事　8月　工程表

期間：2024年　7月 22日　～　2024年　9月　1日

(2024年　8月　1日作成)

期間	7月										8月																															9月
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1
作業	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

【勤務計画】

NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　夏期休暇(8/10～8/18)　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日

早朝搬入(AM4:00～6:00)
深夜搬出(PM9:00～11:00)

【本庁棟】

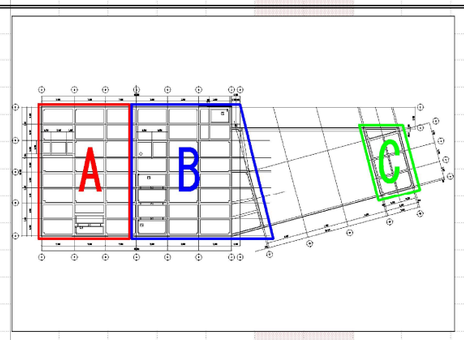

基礎工事
- A工区→B工区
- 梁、耐圧版配筋 170t（0.7t/人工、12人/日）実働21日
- A工区 外部型枠 140m2
- CB溶接
- UT検査
- ｴｱﾌｪﾝｽ、柱建ち確認
- A工区 耐圧版CON・ﾓｯｸｱｯﾌﾟ（210）
- 墨出し
- 基礎梁建込 690m2（15m2/人工、5人/日）実働9日
- 基礎梁建込 980m2 15m2/人工、9人/日）実働
- 基
- A・B
- B工区 外部型枠 140m2(15m2/人工 3人/日)実働3日
- 柱建ち確認
- B工区 耐圧版CON(277)

土工事
- アンカーセット
- 地足場
- C工区
- CB溶接
- UT検査
- 基礎梁、耐圧版配筋 25t（0.7t/人工、12人/日）実働3日
- 外部型枠 85m2
- C工区 耐圧版CON(43)
- アンカーセット

【地下燃料タンク】
- 掘削
- 捨てコン
- 墨出し
- ﾍﾞｰｽ配筋
- 型枠

電気工事
- C工区墨出し
- A工区ｽﾘｰﾌﾞ
- B工区ｽﾘｰﾌﾞ
- C工区ｽﾘｰﾌﾞ

衛生設備工事
- C工区墨出し
- A工区ｽﾘｰﾌﾞ
- B・C工区ｽﾘｰﾌﾞ

【行事】
- 定例会議 建災防安パト 安全衛生協議会
- ｽﾘｰﾌﾞ検査 10:00～
- 配筋検査(A) 15:00～ ﾓｯｸｱｯﾌﾟ確認 14:00～ 定例会議
- 定例会議
- ﾓｯｸｱｯﾌﾟ、型枠解体 15:30～
- 配筋検査(B・C) 15:00～
- 定例会議
- 安全衛生協議会
- 定例会議

【重機作業計画】
- 50tRC
- 50tラフタークレーン
- ﾊﾞｯﾌﾟ車
- ﾊﾞｯﾌﾟ車
- 0.45BH

【重点管理項目】
- 品質：配筋、かぶり厚さの確認
- 安全：重機との接触注意、玉掛合図の徹底
